CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA	335222024	974162/2024	CASAS POPULAR

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

25. Administração local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

	Nº do Evento	Título dos Eventos	QUADRA 13 (5 UHS)	QUADRA 14 (11 UHS)	QUADRA 24 (14 UHS)	QUADRA 25 (7UHS)	QUADRA 26 (7 UHS)	QUADRA 36 (2 UHS)	QUADRA 39 (4 UHS)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10					
FILTRO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
F	1	Serviços Preliminares	1	1	2	2	2	3	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
F	2	Fundação e Esgoto (Radier)	1	1	2	2	2	3	3															
F	3	Supra estrutura	2	3	3	4	4	4	5															
F	4	Alvenaria	2	3	3	4	4	4	5															
F	5	Janelas	6	6	6	7	7	8	8															
F	6	Portas	4	4	6	6	6	8	8															
F	7	Estrutura de Cobertura	4	4	5	5	5	6	6															
F	8	Telhamento	4	4	5	5	5	6	6															
F	9	Revestimentos Internos/Externos (Chapisco)	3	3	4	4	5	5	6															
F	10	Revestimentos Internos/Externos (Reboco)	4	5	5	6	6	7	7															
F	11	Revestimentos Cerâmicos	5	5	6	6	7	7	7															
F	12	Forros	5	5	6	6	6	7	7															
F	13	Pintura (Selador Acrílico)	5	5	5	6	6	6	6															
F	14	Pintura (Paredes)	6	6	7	7	8	8	8															
F	15	Pintura (Esquadrias)	6	6	7	7	8	8	8															
F	16	Contrapiso	5	5	6	6	7	7	7															
F	17	Piso Cerâmico / Rodapé	7	8	8	9	9	10	10															
F	18	Instalações Elétricas (Eletrodutos/Caixas/ Qua	5	6	7	8	9	10	10															
F	19	Instalações Elétricas (Cabos, , Disjuntores)	4	4	5	5	6	6	6															
F	20	Instalações Elétricas (Tomadas, Interruptores	8	8	9	9	10	10	10															
F	21	Instalações Hidráulicas	5	6	7	8	9	10	10															
F	22	Instalações Sanitárias	5	5	6	6	7	7	7															
F	23	Louças e Metais	9	9	9	10	10	10	10															
F	24	Limpeza Final de Obra	5	5	6	6	7	7	7															
F	25	Administração local								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	26	0																						
	27	0																						
	28	0																						
	29	0																						
	30	0																						
	31	0																						
	32	0																						
	33	0																						

34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0
51	0
52	0
53	0
54	0
55	0

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10
Parcela	%	5,35%	10,42%	10,94%	15,64%	23,09%	16,50%	7,58%	4,19%	3,78%	2,51%
	R$	377.853,32	735.426,48	772.614,54	1.103.903,96	1.630.296,40	1.164.678,05	534.998,99	295.542,05	267.006,59	176.925,07
Acumulado	%	5,35%	15,77%	26,72%	42,35%	65,45%	81,95%	89,52%	93,71%	97,49%	100,00%
	R$	377.853,32	1.113.279,80	1.885.894,34	2.989.798,30	4.620.094,70	5.784.772,75	6.319.771,74	6.615.313,79	6.882.320,38	7.059.245,45
Administração Local	%	5,00%	15,00%	26,00%	42,00%	65,00%	81,00%	89,00%	93,00%	97,00%	100,00%

ITURAMA

Local

segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Data


Responsável Técnico
Nome: LIANA DE FATIMA QUEIROZ MALTA
CREA/CAU: 5062247330/D-SP
ART/RRT: MG20254229878

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
335222024	974162/2024	CASAS POPULAR

23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

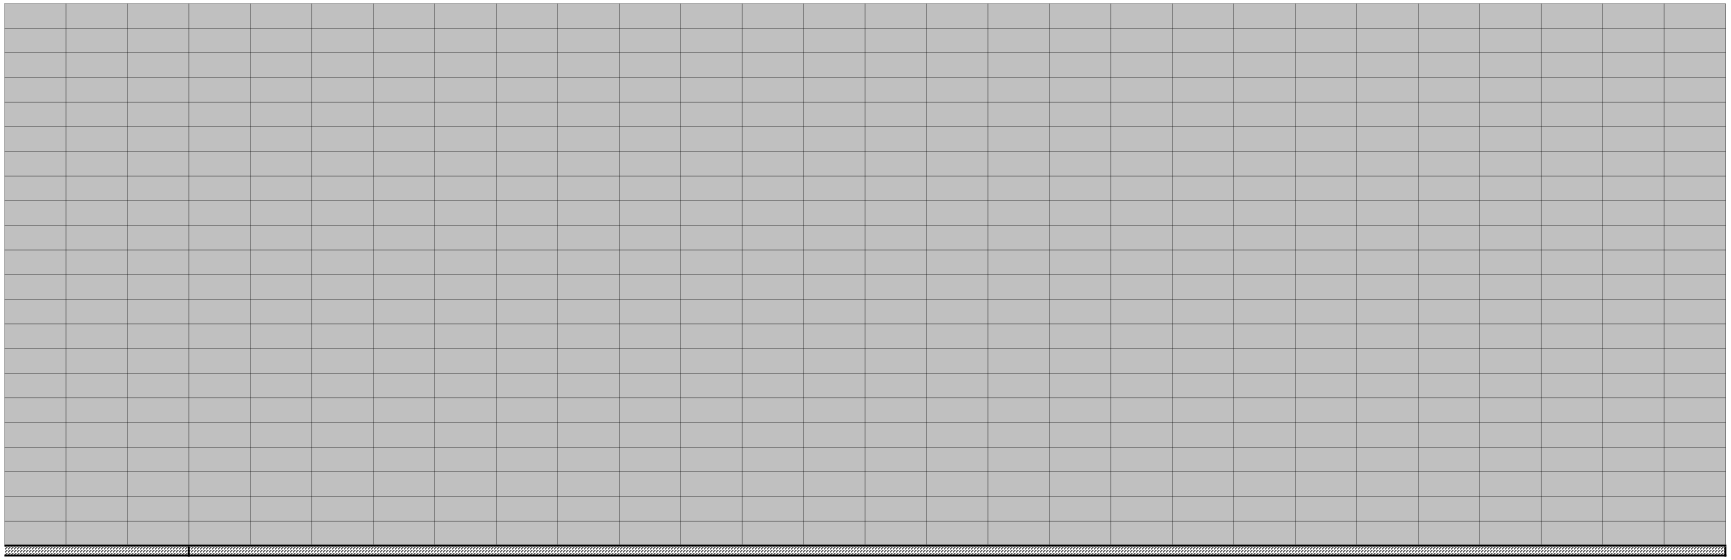

			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10		
		%	5,35%	10,42%	10,94%	15,64%	23,09%	16,50%	7,58%	4,19%	3,78%	2,51%		
		R$	377.853,32	735.426,48	772.614,54	1.103.903,96	1.630.296,40	1.164.678,05	534.998,99	295.542,05	267.006,59	176.925,07		
		%	5,35%	15,77%	26,72%	42,35%	65,45%	81,95%	89,52%	93,71%	97,49%	100,00%		
		R$	377.853,32	1.113.279,80	1.885.894,34	2.989.798,30	4.620.094,70	5.784.772,75	6.319.771,74	6.615.313,79	6.882.320,38	7.059.245,45		
		%	5,00%	15,00%	26,00%	42,00%	65,00%	81,00%	89,00%	93,00%	97,00%	100,00%		

Responsável Técnico
Nome: LIANA DE FATIMA QUEIROZ MALTA
CREA/CAU: 5062247330/D-SP
ART/RRT: MG20254229878
